


# 变 更 通 知 单

项目名称	收费大棚维修改造工程	变更编号	变更-1
工程名称	京港澳高速公路京石段保定收费站	工程编号	2022-07-1
设计单位		专 业	
审 定	审 核	专业负责人	校 对
	益志新	益志新	李志新
变更原因	针对现场情况调整		


因施工时装饰构件材料更换及立面细化，对结构构件重新复核，调整如下。

- 1、新增钢架的高度调整，其中6~7轴调整为2100，其余网架上钢架调整为2000，单独柱钢架调整为1700。
- 2、网架上钢架除立柱外，其余钢构件截面尺寸调整为方钢管100X4。
- 3、结构-2~4，网架上新增钢架端部调整如下图所示，钢架坡度及细部尺寸若与建筑图冲突，以建筑图为准。

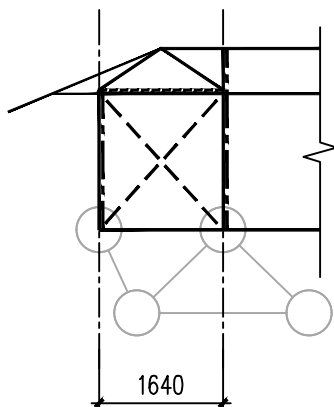

- 4、结构-4，因现场采购问题，钢梁上新增钢架除立柱外，其余构件可调整为150X4。

M-1埋件调整如下图。

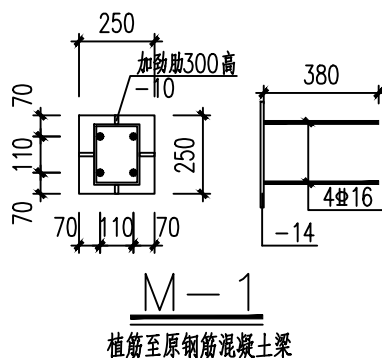

以下空白。
